

CRM Transformation 2027

Kunde: Beispielwerke Industrie GmbH

Erstellt von: Nicht angegeben | Stand: 9.10.2026

VERTRAULICHE MODELLRECHNUNG - keine bestätigte Investitionsentscheidung.


Management-Fazit

Der berechnete wirtschaftliche Saldo gegenüber dem fortgesetzten Bestandssystem beträgt 42.583 EUR nach 36 Projektmonaten. Die wirtschaftliche Amortisation erfolgt im Projektmonat 35.

Im Modell wurden 3 monetäre Kunden-Metrics angesetzt. 3 davon sind nicht als kundenseitig geprüft gekennzeichnet. 2 weitere Kennzahlen werden nicht als sichere Geldeinsparung gewertet.

AMORTISATION	WERTBEITRAG	MODELL-ROI
Monat 35 Einmalige Projektkosten	42.583 EUR	5,5 % 480.000 EUR
Gesamte neue Software-/Projektkosten		768.000 EUR
Gesamtnutzen inkl. Altsoftware-Wegfall		810.583 EUR
Kumulierter Nettovorteil		42.583 EUR
Tiefster kumulierter Saldo		-531.278 EUR (M7)

Wirtschaftlicher Verlauf

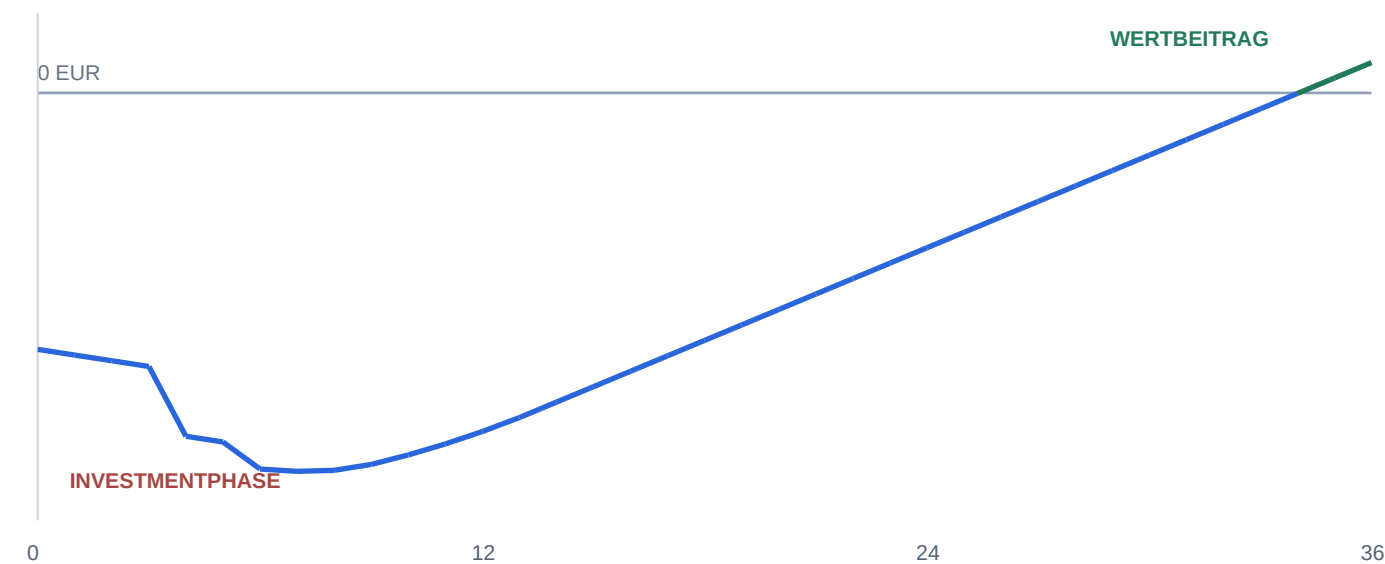

Der Modell-ROI ist definiert als kumulierter Nettovorteil geteilt durch die gesamten neu angesetzten Projekt- und Softwarekosten im gewählten Zeitraum. Er ist undiskontiert und kein IRR / Kapitalwert / Liquiditäts-ROI.

Investitionen und laufende Kosten

Einmalig | Einführung und Customizing

360.000 EUR einmalig | ab Monat 0

Einmalig | Datenmigration und Integration

90.000 EUR einmalig | ab Monat 4

Einmalig | Training und Change Management

30.000 EUR einmalig | ab Monat 6

SaaS / Betrieb | Neue CRM-SaaS-Lizenzen

8.000 EUR / Monat | ab Monat 1

Wegfall Bestand | Entfall alte CRM-Lizenzen

3.000 EUR / Monat | ab Monat 10

Angerechnete Kunden-Metrics

Wegfall externer Vertriebsunterstützung | 110.000 EUR / Jahr

Direkter EUR-Wert pro Jahr | ab Monat 7 | Hochlauf 3 Monat(e) | Unbestätigte Hypothese

Nachweis / Realisierung: Fiktive Annahme: Externe Leistungen entfallen erst nach erfolgreicher Prozessumstellung. Vertragskündigung und Vollkosten sind noch zu prüfen.

Geringere Bearbeitungskosten im Service | 60.000 EUR / Jahr

Vorgangsmenge x Kostendifferenz | ab Monat 7 | Hochlauf 3 Monat(e) | Unbestätigte Hypothese

Nachweis / Realisierung: Fiktiv: 30.000 Vorgänge pro Jahr $\times$ 2 EUR tatsächlich vermeidbare Fremd-/Prozesskosten. Mengen und Realisierung nicht bestätigt.

Mehr Abschlüsse durch bessere Conversion | 150.000 EUR / Jahr

Zusätzliche Abschlüsse x Deckungsbeitrag | ab Monat 9 | Hochlauf 6 Monat(e) | Unbestätigte Hypothese

Nachweis / Realisierung: Fiktiv: 125 zusätzliche Aufträge/Jahr $\times$ 1.200 EUR Deckungsbeitrag (nicht Umsatz). Vertriebskapazität und Kannibalisierung sind ungeprüft.

Nicht angerechnete Kennzahlen

CRM-Nacharbeit: 9 auf 3 Stunden pro Woche | Zeitgewinn x Stundensatz (nur Kapazität) | nicht im Basiswert

Status: Unbestätigte Hypothese. 85 Mitarbeitende $\times$ 46 Wochen; 23.460 Stunden jährliche potenzielle Zeitersparnis. 1.360.680 EUR rechnerischer Kapazitätswert, keine belegte Geldersparnis. Nicht zusätzlich zu bereits enthaltenen Wirkungen anrechnen.

Weniger Service-/Compliance-Risiken | Geschätzter Risikowert (nicht angerechnet) | nicht im Basiswert

Status: Unbestätigte Hypothese. Reine fiktive Risikoschätzung, weder sichere Ersparnis noch verifizierter Erwartungswert. Außerhalb des Basis-Payback.

Vor einer Kundenentscheidung zu validieren

OFFEN: Wegfall externer Vertriebsunterstützung - Unbestätigte Hypothese. Kostenwirkung, Umfang, Start und Datenquelle mit Kunde/Finance prüfen.

OFFEN: Geringere Bearbeitungskosten im Service - Unbestätigte Hypothese. Kostenwirkung, Umfang, Start und Datenquelle mit Kunde/Finance prüfen.

OFFEN: Mehr Abschlüsse durch bessere Conversion - Unbestätigte Hypothese. Kostenwirkung, Umfang, Start und Datenquelle mit Kunde/Finance prüfen.

Rechnung und Aussagegrenzen

Monatlicher Saldo = tatsächlich im Modell angerechnete Monatsnutzen inklusive wegfallender Bestandssystemkosten minus neue Software- und Projektkosten. Kumulierter Saldo = Summe bis zum Projektmonat.

Modell-ROI (%) = (kumulierte angerechnete Nutzen - kumulierte neue Kosten) / kumulierte neue Kosten x 100. Nicht definiert, wenn neue Kosten = 0 EUR.

Jährliche Softwarebeträge werden gleichmäßig durch zwölf dividiert. Einmalinvestitionen fließen im angegebenen Projektmonat ein. Nutzungseffekte beginnen in dem je Metric erfassten Monat und berücksichtigen den Hochlauf.

Keine modellierten tatsächlichen Zahlungstermine, Jahresvorauszahlungen, Steuern, Finanzierung, Diskontierung, NPV/IRR oder unabhängige Kundenprüfung. Kapazitätsgewinne und Risikohypothesen sind explizit nicht eingerechnet.

Datenbasis: individuelle Projektangaben zum Exportzeitpunkt. Anbieter-Referenzen (M1), Verkäuferhypothesen und kundenbezogene Aussagen werden nicht als automatisch verifizierte M2 dargestellt.

Monatswerte - Prüfspur

M00 Kosten 360.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -360.000 EUR

M01 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -368.000 EUR

M02 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -376.000 EUR

M03 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -384.000 EUR

M04 Kosten 98.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -482.000 EUR

M05 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -490.000 EUR

M06 Kosten 38.000 EUR | Nutzen 0 EUR | Saldo -528.000 EUR

M07 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 4.722 EUR | Saldo -531.278 EUR

M08 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 9.444 EUR | Saldo -529.833 EUR

M09 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 16.250 EUR | Saldo -521.583 EUR

M10 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 21.333 EUR | Saldo -508.250 EUR

M11 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 23.417 EUR | Saldo -492.833 EUR
M12 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 25.500 EUR | Saldo -475.333 EUR
M13 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 27.583 EUR | Saldo -455.750 EUR
M14 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -434.083 EUR
M15 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -412.417 EUR
M16 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -390.750 EUR
M17 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -369.083 EUR
M18 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -347.417 EUR
M19 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -325.750 EUR
M20 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -304.083 EUR
M21 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -282.417 EUR
M22 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -260.750 EUR
M23 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -239.083 EUR
M24 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -217.417 EUR
M25 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -195.750 EUR
M26 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -174.083 EUR
M27 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -152.417 EUR
M28 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -130.750 EUR
M29 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -109.083 EUR
M30 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -87.417 EUR
M31 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -65.750 EUR
M32 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -44.083 EUR
M33 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -22.417 EUR
M34 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo -750 EUR
M35 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo 20.917 EUR
M36 Kosten 8.000 EUR | Nutzen 29.667 EUR | Saldo 42.583 EUR
